

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Bauten
Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst



Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provincia Autonoma de Bulsan
Assessorat per i lëures publics
Rep. 11 - Frabichè y sorvisc technich

Projekt

Progetto

Kodex

22.03.008.195.01.3.17.1

Codice

UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN
NEUE KLINIK
MEDIZINTECHNIK


RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE DI BOLZANO
NUOVA CLINICA
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

AUSFÜHRUNGSPROJEKT PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt

MEDIZINTECHNIK I TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Contenuto

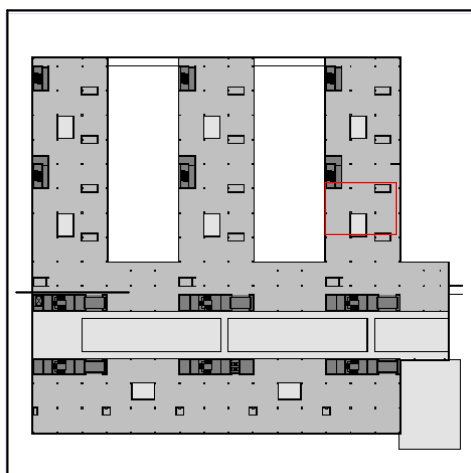

Lieferung und Montage eines
Computertomographen für
die Röntgendiagnostik /
Fornitura e montaggio di un
tomografo computerizzato
per Radiodiagnostica

**TERMINPLAN /
CRONOPROGRAMMA**

Plan Nr. | Tavola n.

M.8.C1704

Maßstab

Datum

Januar / Gennaio 2019

Änderung

00

Scala

Data

Modifica

Bauherr | Committente

Planer | Progettista

Der Verfahrensverantwortliche
Il responsabile del procedimento

39100 BOZEN | BOLZANO
Landhaus 2 - Palazzo 2
Silvius-Magnago-Platz 10 p.zza Silvius Magnago

Dr. Ing. Domenico Cramarossa

Ai+g
ASSOCIATI
PARTNER



Cert.N.AJA/EU/12/12826
ISO 9001:2008

Via Volta, 3 - 39100 Bolzano - Italy
Tel 0471 066969 - Fax 0471 501209
e-mail: info@aigservice.it

Dr. Ing. Stefano Mattei

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN
AM HOHENGAREN 1 D 70188 STUTTGART



Biomedical Technology Consulting S.r.l.

B.T.C. Srl - GmbH
Via Altmanstrasse 10A
39100 Bolzano/Bozen

Tel. 0471/200372
Fax 0471/300574
P.N.A. - MwSt. 0222620011

Genehmigungen

Approvazioni

TERMINPLAN
CRONOPROGRAMMA

Nome attività	Duration	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
1 LIEFERUNG UND MONTAGE EINES COMPUTERTOMOGRAPHEN FÜR DIE RÖNTGENDIAGNOSTIK / FORNITURA E MONTAGGIO DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PER RADIODIAGNOSTICA	451 d																	
2 Frist für die fertigestellung der Lieferung / Tempo utile per l'ultimazione della fornitura	90 d																	
3 Erster Teil der Lieferung / Prima consegna	68 d																	
4 Zeitpunkt 0: Beginn der Ausführung des Vetrags / Tempo 0: Avvio dell'esecuzione del contratto	1 d																	
5 Konstruktionsplan / Progettazione costruttiva	15 d																	
6 Bestätigung Konstruktionsplan / Approvazione costruttivo	15 d																	
7 Vorbereitung der Lieferung Phase 1 / Preparazione fornitura Fase 1	30 d																	
8 Vorarbeiten zur Installation der zu liefernden Geraete und Montage der Unterkonstruktionen / Predisposizioni alle installazioni delle attrezzature da fornire e montaggio delle sottostrutture	7 d																	
9 Zeitpunkt Phase 1 / Tempo FASE 1	0 d																	
10 Zweiter Teil der Lieferung / Seconda consegna	59 d																	
11 Vorbereitung der Lieferung Phase 2 / Preparazione fornitura Fase 2	52 d																	
12 Montage der zu liefernden Geräte / Montaggio delle attrezzature da fornire	7 d																	
13 Zeitpunkt Phase 2 / Tempo FASE 2	0 d																	
14 <u>Endabnahme / Collaudo finale</u>	180 d																	
15 Zeitpunkt Phase 3 / Tempo FASE 3	0 d																	
16 Abschluss der Umzüge von Abteilungen-Dienste / Ultimazione trasferimento reparti-servizi	180 d																	
17 Beginnning der Garantiedauer von zwei Jahren / Inizio Validità garanzia di due anni	1 d																	

Cronoprogramma in giorni solari - Terminplan in Kalendertagen
In **rosso** le attività a cura dell'Amministrazione - Im **rot** die Aktivitäten durch die Verwaltung
